



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

ZONAS AJARDINADAS CNG

Enero, 2015

Presentes: Dña. Elena Cadenas, Becaria Green Section
D. Eloy Barranco, Técnico en Prácticas RFEG

INFORME ENERO ZONAS AJARDINADAS CENTRO NACIONAL DE GOLF

Durante el mes de Enero, se han prolongado los continuos descensos de las temperaturas y heladas. El estado general de la zonas de la entrada y parking se mantienen en buen estado y el resto de las zonas han continuado con las labores de poda y desbroces.

En cuanto a la pradera, continúa en el mismo estado que el mes anterior, sólo se ha limpiado las arquetas pero no se están realizando comprobaciones de los elementos de riego. Es fundamental empezar a comprobar las fases de riego para ir reformando e instalando los componentes averiados.

Se incluyen el presupuesto y los planos para una posible reforma del sistema de riego, que se adjunta en el ANEXO I del presente informe.

A continuación se detallará el estado de cada una de las zonas y las tareas a realizar.

Pradera

Se han limpiado las arquetas y se ha segado una vez por semana.



Foto 1: Estado general de la pradera.

El riego ha continuado suspendido y no ha sido necesario realizar ninguna aplicación. Como se ha comentado al principio del informe, es muy importante que se realicen comprobaciones de las electroválvulas y elementos de riego debido a su abundancia y requieren de su atención de cara a los próximos meses.



Foto 2: Estado general de las arquetas de riego.

Las recomendaciones para la pradera son las siguientes:

- * Continuar con la siega de una vez por semana.
- * Revisar el estado de las arquetas, electroválvulas y aspersores.

Zona de entrada al CNG y a la Federación

Continúa su buen estado estético. Los setos de las diferentes zonas y arriates están exentos de malas hierbas y podados



Foto 3 y 4: Estado general de la entrada y parking.

Zona del parking

Todos los parterres continúan en buenas condiciones con los setos podados y zonas desbrozadas.

Cabe destacar, como señal de atención tanto para los responsables de las zonas ajardinadas, la necesidad de vigilar con una mayor atención el estado de las papeleras de esta zona, que empeoran notablemente la imagen de la misma y en general del campo.



Foto 5. Detalle del estado de las papeleras de la zona del parking

Zona de subida al putting green

Se mantiene el mismo estado que el mes pasado, con las zonas podadas y ajenas de malas hierbas. La zona de la cafetería se ha limpiado y su estado general es correcto.

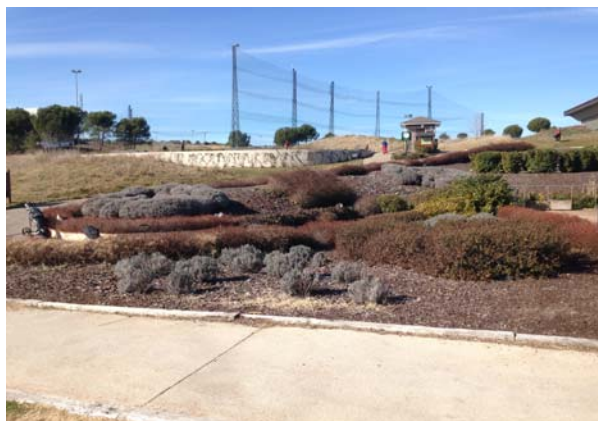


Foto 6: Estado general de la zona.

Zona de putting green

Se han realizado la poda de las lavandas y desbroces de los parterres, presentando un buen estado de la zona.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 7: Poda de las lavandas y estado general de la zona.

Arbolado de los Tees

No se ha realizado ningún cambio ni mantenimiento en esta zona. Todo continúa en correcto estado.

En referencia al presupuesto, se ha pedido a la empresa un desglose de las partidas presupuestarias, para conocer el precio del material; tras comunicación con la misma, éste declina nuestra petición

**Departamento Green Section
Real federación Española de Golf**



ANEJO I. INSTALACIÓN SISTEMA DE RIEGO

PRESUPUESTO
PLANOS




CLIENTE: Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte nº5
C.P: 28035
MADRID

C/Camino de la Zarzuela 15B 2ª Planta
28023 MADRID
Tfno 91.169.70.53


Referencia: RFEG02_01.15

DESCRIPCIÓN	UDS	€/UD	TOTAL €
1. INSTALACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO PARA LA PRADERA			
1.1 ASPERSORES (UDS) Suministro e instalación de aspersor de turbina 3/4" HUNTER PGP - ADJ de largo alcance.	51	16,25	828,75
1.2 ELECTROVÁLVULA (UDS) Suministro e instalación de electroválvula Rain Bird 1" con solenoide de 9V, incluidas pilas.	8	52,15	417,2
1.3 TUBERÍA D32 (m) Suministro e instalación de Tubería de 32 mm de PE, en 6 atm de baja densidad, incluidos accesorios de unión.	200	2,15	430
1.4 MP ROTATOR (UDS) Suministro e instalación de MP Rotator Hunter ajustable.	4	23,15	92,6
1.5 PROGRAMADOR (UDS) Suministro e instalación de programador autónomo de 2 fases modelo WP2 de Rain Bird.	2	147,4	294,8
1.6 PIEZAS DE UNIÓN (UDS) Suministro e instalación de todas las piezas de unión necesarias para toda la instalación.	1	52,4	52,4
1.7 COLLARINES (UDS) Suministro e instalación de collarines de 40 mm de diámetro de PE.	55	3,2	176
1.8 VÁLVULA DE ESFERA (UDS) Suministro e instalación de válvula de esfera 1", incluidos accesorios de unión.	4	28,9	115,6
1.9 MACHÓN DE METAL (UDS) Suministro e instalación de Machon metal 1".	4	2,2	8,8
1.11 TUBERÍA D16 (m) Suministro e instalación de tubería de 16 mm de PE, en 6 atm de baja densidad, incluidos accesorios de unión.m de Tubería SP100 de 16 mm.	100	1,15	115
TOTAL			2531,15
I.V.A NO INCLUIDO			
Enero de 2015 PONTECEO S.L.			

PRADERA 1

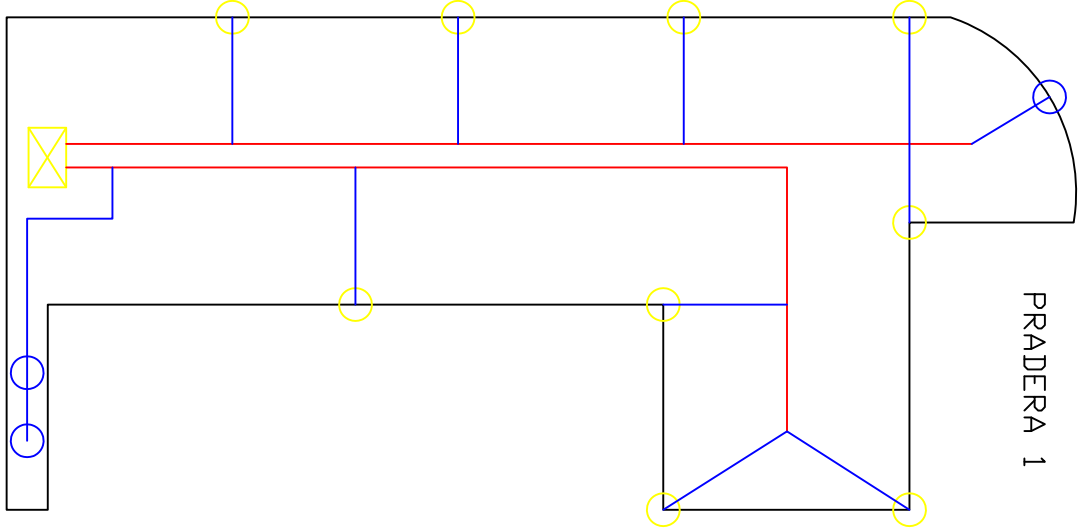

PRADERA 2

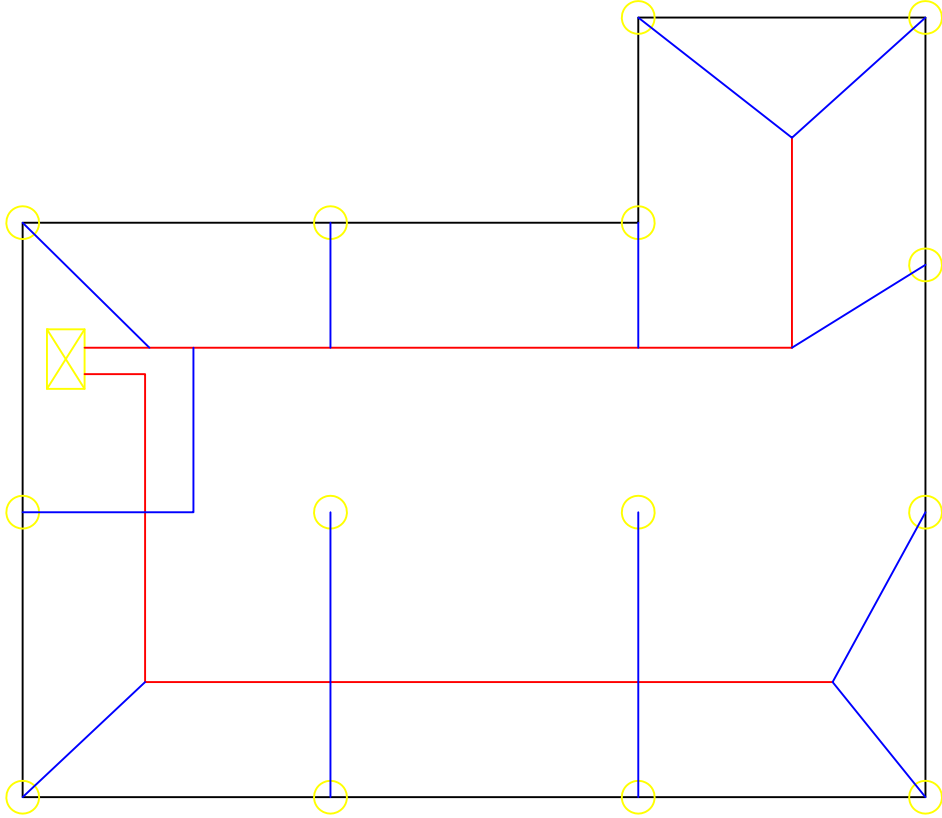

ASPERSOR

MP ROTATOR



D16mm




D32mm




ARQUETA

PRADERA 3

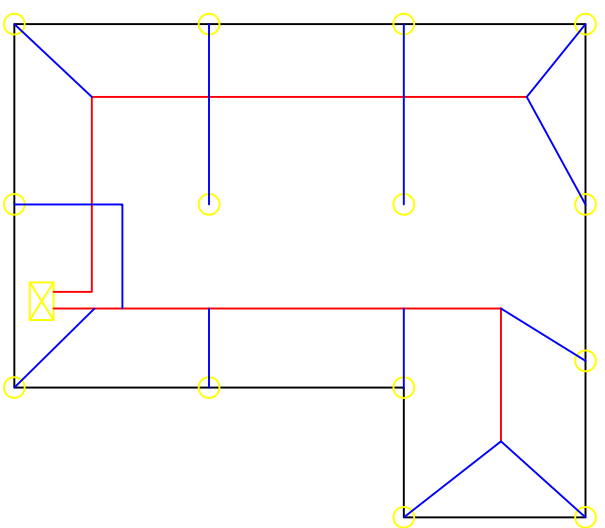

PRADERA 4

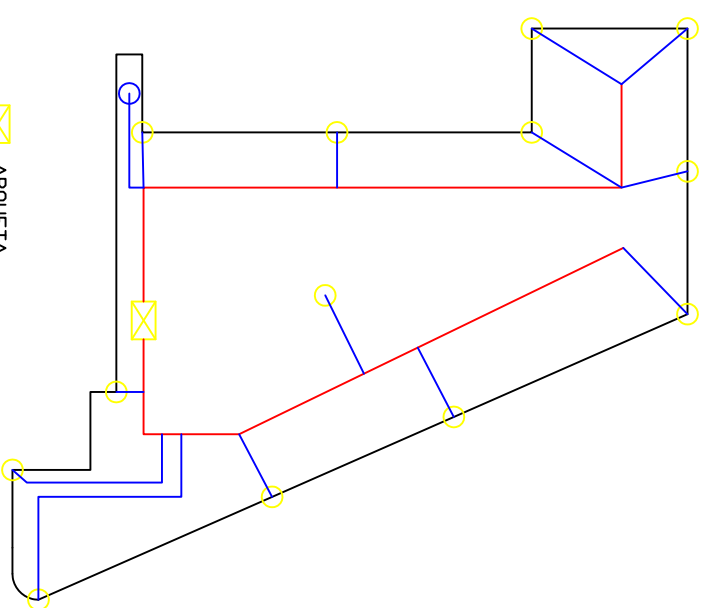

○ ASPERSOR
○ MP ROTATOR
— D16mm
— D32mm

⊠ ARQUETA
