


INFORME CANDELEDA GOLF DICIEMBRE 2011

Tras la visita realizada al campo de golf de Candeleda el pasado 22 de Noviembre, pasamos a considerar el estado actual del campo y las tareas a realizar para el mes de Diciembre:

1. **Greenes.**

Los **greenes** en Candeleda Golf son actualmente la zona con **mejores condiciones** para la práctica del golf. Siempre nuestro objetivo ha sido presentar unos greens en excelentes condiciones y con la realización de las labores actuales, consideramos que el objetivo se encuentra cada vez más cerca.

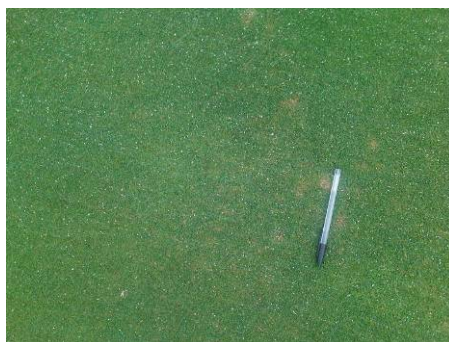

Para este mes de Diciembre debemos principalmente realizar las siguientes labores:

1. Al igual que en anteriores informes consideramos fundamental la realización en los greens de **cortes diarios**, con la finalidad de conseguir una superficie de juego en condiciones óptimas.
2. Realizaremos un tratamiento fungicida mediante **Propiconazol** a dosis de **2 l/ha**. Es importante que se haga en un día sin previsión de lluvia.

Respecto a los antegreens se observa que **no se ha realizado la labor de resiembra** por lo que el estado de los mismos es muy deficiente. Debido a las condiciones ambientales y época del año en la que nos encontramos la realización de la resiembra debe posponerse a la primavera.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



En antegreenes realizaremos el **abonado** coincidiendo con el de calles-tees, mediante **20 g/m²** de **15-5-20**. Recordamos realizar **riego posterior**.

2. Calles, tees y rough.

El estado de estas zonas del campo está marcado por las condiciones de falta de agua durante los meses de verano. Actualmente nos encontramos en plena **transición** de especies de **clima cálido** a las especies de **clima frío** que en Candeleda aparecen de forma natural sin necesidad de resiembras otoñales. Sin embargo, durante este periodo de transición el campo ofrece unas muy deficientes condiciones para el juego. Durante los próximos meses evaluaremos la posibilidad de realizar una resiembra en primavera en estas zonas con la finalidad de presentar el campo en mejores condiciones.



Respecto al problema con los **jabalíes** podemos considerar muy positivo la **colocación** de la valla perimetral por parte del personal del Ayuntamiento.



Además se está realizando la **preparación** de los terrenos y posterior **semillado** de las zonas destruidas por los jabalíes. Respecto a estas labores debemos considerar los siguientes aspectos:

- En las **primeras zonas** que se resembraron podemos observar la **germinación óptima** de la semilla, lo cual permitirá la maduración de la planta previa a la temporada invernal. Sin embargo para las zonas **más retrasadas** en los trabajos, la semilla **no** encontrará las mismas **condiciones ambientales** para germinar y madurar por lo que posiblemente no presentemos estas zonas en buenas condiciones durante el invierno. En cualquier caso, todo dependerá de las condiciones climáticas durante los próximos días.



- Debemos **señalizar** mediante pintura estas zonas resembradas para que el jugador conozca que tratamiento debe dar a la bola si reposa en estas zonas. Además es importante delimitar con **cuerdas** las zonas de mayor tamaño para evitar que los jugadores entren con los carros o vehículos ya que producirían daños en las plantas jóvenes.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Para el mes de Diciembre procuraremos mantener la **frecuencia de corte** y se realizará un abonado destinado a facilitar el aumento de densidad de las especies de clima frío presentes actualmente. El **abonado** se realizará mediante **20 g/m²** de **15-5-20**, recordando la necesidad de realizar **riegos posteriores** para deshacer el grano de abono.

3. Bunkers.

Los bunkers prestan un buen estado. Durante la visita pudimos comprobar como el ayuntamiento está haciendo acopio de arena para aumentar la cantidad en los bunkers, aspecto que consideramos muy importante por lo que durante las próximas semanas se espera poder realizar la **incorporación de la arena** por parte del personal auxiliar del Ayuntamiento.



4. Riego.

El pasado año se realizó una auditoría de riego para detectar las deficiencias que pudiera tener el sistema, tras la cual se definieron las líneas de actuación y las modificaciones a realizar. Se ejecutó una primera fase en la obra de riego con el desdoblamiento de los ramales de varias zonas y la eficiencia del riego en estas zonas ha sido muy buena durante este verano, por lo tanto esperamos que se pueda finalizar la obra durante los próximos meses. Para acometer esta obra se realizará por parte del personal del campo, un **informe** con el **material** necesario y las **zonas** a finalizar. Además para la realización de este informe consideramos fundamental la **colaboración** del **técnico** de la empresa especializada de riego que el pasado año colaboró con Candeleda Golf para la dirección técnica de la obra.

Consideramos importante que el personal auxiliar del Ayuntamiento pueda realizar la **limpieza** y **nivelación** de **aspersores** del campo, en colaboración con el personal del mismo.

Continuamos a la espera de que se produzca la **reunión** con los **mecánicos** para poder comenzar a realizar las **reparaciones** y **mantenimiento preventivo** en la maquinaria de Candeleda Golf.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Objetivos durante las próximas semanas:

- Tratamiento en greens.
- Finalizar acondicionamiento de las zonas dañadas por los jabalíes.
- Mantener la frecuencia de corte en todas las zonas.
- Fertilización en antegreens, calles y tees mediante 20 g/m² de 15-5-20. Riego posterior.

En líneas generales, estas son las labores principales a realizar en Candeleda Golf, y sobre las que realizaremos el seguimiento en las próximas semanas.

Muchas gracias por la atención recibida durante la visita. Un saludo.

Departamento *Green Section*

Real Federación Española de Golf
