

INFORME SEPTIEMBRE CAMPO DE GOLF DE EL SALER

Tras la visita realizada el pasado 25 de Agosto al campo de golf de El Saler, pasamos a analizar el estado actual del campo y a describir las tareas a realizar durante el mes de Septiembre.

A lo largo de este mes se llevaran a cabo las labores de pinchado y resiembra. Por lo que será necesaria una gran coordinación de todo el equipo del campo de golf.

GREENS

Los greens se encuentran en muy buena condición. Presentando buen color, buena densidad, una buena rodada de la bola y ausencia de enfermedades (**foto 1**).



Foto 1. Vista del green #3.

A pesar de todo lo acontecido con el riego durante estos meses, los greens han mostrado un estado similar durante todo el verano. Esto se debe al gran trabajo de mantenimiento que se ha realizado en ellos durante todo el verano. Son greens que poseen estructura y por lo tanto, pueden hacer frente a situaciones de estrés. No obstante, los greens con mayor porcentaje de *Poa annua* se comportan de peor manera, siendo más sensibles al estrés.

Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del 5 al 9:

- Tratamiento con *Azoxystrobin* a una dosis de 1 l/Ha. Con un volumen de aplicación de 600 l/Ha.
- Aplicación de Spersal a una dosis de 5 l/Ha. Con un volumen de aplicación de 600 l/Ha y un riego posterior de 5-6 minutos.

2. Semana del 12 al 16: Pinchado de greens.

- Se recomienda un pase de verticut previo al pinchado.
- Pinchado hueco, resiembra, recebo y abonado con 18-22-5 a una dosis de 20 gr/m².

3. Semana del 19 al 23: Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha. Con un volumen de aplicación de 600 l/Ha.

4. Se valorará un *spoon feeding* en función de la recuperación de los greens.

5. La posición de bandera se cambiará, como mínimo, tres veces por semana.

6. Se continuara con el riego de apoyo con manguera.

ANTEGREENS Y CALLES

Ambas zonas se vieron afectadas por gusanos blancos (**foto 2**). Como se comento en el informe anterior, se decidió cambiar de materia activa, usando Imidacloprid. Siendo hasta el momento el resultado muy satisfactorio, habiéndose controlado la plaga y no observándose montones de arena en las calles a primera hora.

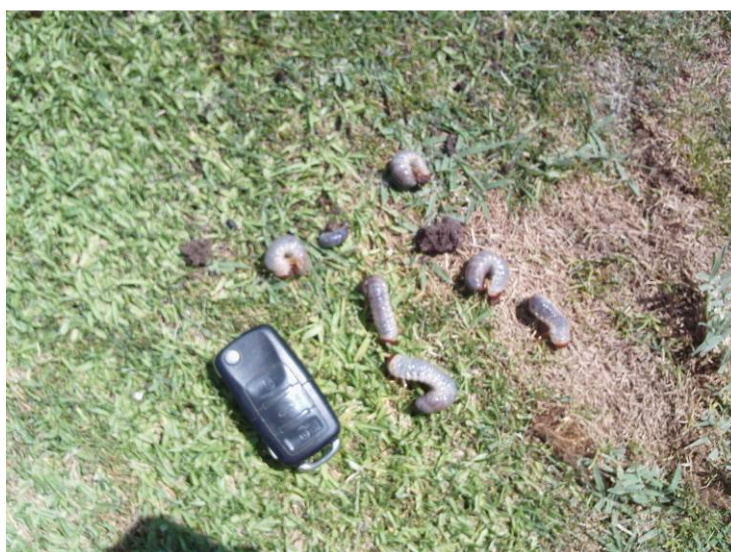


Foto 2. Gusanos blancos en calles antes de tratar con Imidacloprid.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Los **antegreens** se vieron afectados por los problemas de riego pero han aguantado bastante bien (**foto 3**), no habiendo perdido cobertura de césped.



Foto 3. Vista de un antegreen del recorrido. Se pueden observar algunas secas debidas a los problemas con el riego.

Las calles, probablemente, han sido la zona del campo que más se ha visto comprometida por los problemas en el riego (**foto 4**). Pudiéndose observar numerosas secas y alguna zona donde se ha perdido la cobertura de césped.



Foto 4. Vista panorámica de la calle #1.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Las labores a realizar durante este mes serán:

1. Semana del **5 al 9**: Aplicación de Spersal a una dosis de 5 l/Ha. Con un volumen de aplicación de 300 l/Ha y un riego posterior de 5-6 minutos.
2. Las labores de pinchado en los **antegreens** se llevaran a cabo cuando se finalicen en los greens. Siguiendo la secuencia normal para esta labor: pinchado hueco, resiembra, recebo y abonado con 17-24-9 a una dosis de 20 gr/m².
3. Semana del **12 al 16**: Se valorará un tratamiento con Imidacloprid a una dosis de 2 l/Ha con un volumen de aplicación de 300 l/Ha.
4. Semana del **19 al 23**: **Pinchado y resiembra de calles.**
 - Siega a 10 mm.
 - Pase de verticut.
 - Pinchado hueco.
 - Pase de rastra y recogida de restos.
 - Resiembra con la Vicon a una dosis de 50-60 gr/m². Las zonas de alrededor de los bunkers se sembraran con una sembradora de gravedad para evitar que entren semillas dentro de estos.
 - Recebo.
 - Abonado con 17-24-9 a una dosis de 20 gr/m².
 - Durante las dos o tres semanas posteriores a la resiembra se recomienda dar tres ciclos de riego de 4-5 minutos a lo largo del día. De este modo, será posible mantener una humedad constante en los primeros centímetros de suelo, garantizando la nascencia y desarrollo de las plántulas.
 - **7 a 10 días después de la resiembra**: Tratamiento con *Propiconazol* a razón de 2 l/Ha y Fosetyl aluminio a razón de 2 kg/Ha. Con un volumen de aplicación de 300 l/Ha.
5. Se establecerá la altura de corte posterior a la resiembra en 20 mm y, si es posible, las primeras siegas se harán con la maquina rotativa.
6. Las calles permanecerán cerradas al tráfico de buggies de 2 a 3 semanas después de la resiembra.

TEES

Las labores de remodelación de los tees se llevaran a cabo, si es posible, a partir de mediados del mes de octubre. Finalizada la resiembra, se programara esta tarea, haciendo acopio de todos los materiales necesarios, incluidos los necesarios para poner a punto el riego de algunas plataformas.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Mientras tanto, se llevarán a cabo las tareas de mantenimiento rutinario de estas superficies.

ROUGH

Se han realizado la mayoría de las modificaciones que propusieron Nacho Gervás y Miguel Vidaor. Por lo tanto, **se recomienda, dar a las zonas de corte más bajo y donde llega el riego, el mismo tratamiento que a las calles. Llevando a cabo las tareas de pinchado y resiembra en ellas también.**

Además de esto, las labores a realizar serán:

1. **Se continuara con las aplicaciones de *Clorpirifos* granular.**
2. La frecuencia de corte se fijará en función de que el rough se presente de manera uniforme.

BUNKERS

Los bunkers se encontraban bien presentados. Por lo tanto, se continuará con el mantenimiento rutinario que consiste en:

1. Rastrillado 2 ó 3 veces por semana.
2. Alternar las zonas de entrada y salida de la moto de bunkers. Las zonas que se encuentran desgastadas debido al tráfico de la moto de bunkers, se sembraran y se cerraran al tráfico para que se puedan recuperar.
3. Aporte de arena en los bunkers que sea necesario para mantener el mismo nivel de arena en todos los bunkers del recorrido.
4. Perfilado si fuese necesario.

ACOPIO DE MAQUINARIA

Para la realización de las tareas en calles será necesario pedir prestados diversos equipos. Por lo tanto, la Dirección del Parador se hará cargo de solicitar los siguientes equipos a los campos de golf correspondientes:

- Centro Nacional de Golf: Verticadora Veemo del 19 al 23 de Septiembre.
- Real Club de Golf de Manises: Pinchadora arrastrada del 19 al 23 de Septiembre y recebadora de calles del 26 al 30 de Septiembre.

RIEGO

Durante el mes de agosto, a pesar de todas las incidencias ocurridas, quedaron instaladas las 4 bombas verticales nuevas (**foto 5**). Estando en funcionamiento tres de ellas, suministrando el suficiente caudal y presión para poder regar de manera segura, sin alargarse en exceso los tiempos de riego.



Foto 5. Instalación de las bombas verticales nuevas.

Por último, daros ánimos para este mes de duro trabajo que queda por delante y agradecer las atenciones recibidas en todas nuestras visitas.

Recibid un saludo,

Departamento Green Section
Real Federación Española de Golf
