



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto

TALAYUELA GOLF

Octubre, 2012

Presentes:

D. Miguel A. Guerra Mateos. Técnico Green Section

TAL.9.2012

INFORME TALAYUELA GOLF OCTUBRE 2012

El mes de Septiembre ha sido una prolongación del verano precedida por altas temperaturas y nula pluviometría.


Talayuela golf ha continuado durante este mes, con los problemas que ha arrastrado durante todo el verano, ya descritos en informes anteriores, como han sido la falta de agua, obstrucción de aspersores, algas en los lagos entre otros problemas.

Cabe destacar que las previsiones de lluvia son alentadoras pronosticando lluvias generosas en la última semana de Septiembre, lluvias que sin duda pondrán fin a toda la problemática arrastrada durante todo el verano.

Por último, y **por decisión estrictamente presupuestaria** sientó comunicar que queda anulada toda labor cultural que requiera un costo para Talayuela Golf, por lo que **NO se cumplirá el planning anual** destinado a los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre a excepción de los greens, por lo que el mantenimiento del campo vendrá precedido de la siguiente forma:

1. Greens

Los greens a excepción de el resto del campo se han realizado las labores de pinchado, abonado y recebo planificado para esta época. **Foto 1.** La recuperación de los greens esta siendo favorable, las condiciones climáticas y las últimas lluvias caídas han favorecido su pronta recuperación.

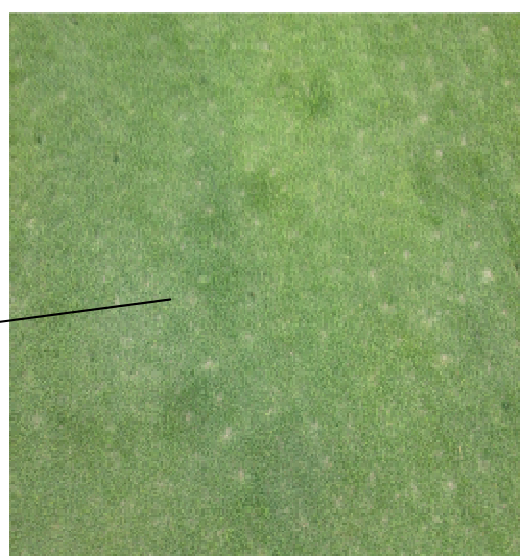

Durante este mes, y una vez se abonen los greens se realizara una prueba en el pitching green con *quinoclamina* a dosis de 75gr/10 ltrs para valorar la resistencia de la poa de los greens ha este herbicida. Principalmente esta resistencia vendrá predecida por la temperatura del suelo y el estado sanitario de la poa.

Labores a realizar durante el mes de Septiembre:

- semana del 15 al 21 realizaremos un tratamiento de azoxistrobin a dosis de 1,5 ltr/ha como tratamiento preventivo a las enfermedades típicas de esta época del año.
- Semana del 29 al 4 de septiembre , abonado de greens mediante abono 18-6-18 a dosis de 15gr/m2.(abono en stock en Talayuela golf)
- Semana del 29 al 4 de septiembre prueba de quinoclamina 75 gr/10 ltr. En pitching green.(Herbicida en stock en Talayuela golf)

2. Antegreenes

En esta zona del campo se han realizados las labores de pinchado, abonado y recebo aunque no se han realizado las labores de resiembra. **Foto 2**



Foto 2. Estado general de los antegreenes.

En esta zona del campo se aplicaran los mismos tratamientos fitosanitarios que en greens.

Las labores a realizar durante el mes de Septiembre serán los siguientes:

- Semana del 29 al 4 de Septiembre, abonado de antegreens mediante abono 18-6-18 a dosis de 15 gr/m². abono en stock en Talayuela golf.

Altura de corte 15 mm

3. Tees.

Los tees se encuentran en buen estado ya que en muchas de ellos la invasión de la grama autóctona y agrostis estolonifera ha superado el 50 %.



Como se ha explicado anteriormente quedan suprimidas cualquier labor que implique un gasto para el club por lo que las labores que NO se realizaran en esta zona serán las siguientes:



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



1. escarificado agresivo mediante tractor y sisis veemo.
2. Pinchado en hueco mediante vertidrain a profundidad de 250 mm
3. aporte de enmienda calcica CaO a dosis de 25 gr/m²
4. Resiembra de ray grass a dosis de 35 gr/m²
5. Abonado 8-24-8 a dosis de 25 gr/m²
6. Recebo mediante arena de sílice 0308.

La no realización de estas tareas traerá consecuencias tales:

- Falta de oxigenación del suelo y como consecuencia:
 - Disminución del sistema radicular
 - Black layer
 - Mayor thach o colchón.
 - Menor densidad de planta.
 - Menor resistencia a pisoteo y enfermedades.
 - Peor aspecto visual.
- **Falta de densidad**, la no realización de resiembra sumada a la gran invasión de grama autóctona darán una visión parcheada una vez entre esta última en latencia.

Altura de corte 15 mm.

4 y 5. Calles y rough.

Las calles han sido las mas perjudicadas durante todo el verano por la ausencia de agua y el ataque de diferente enfermedades como la *rhizoctonia*. La falta de agua y el no haber tenido la planta fuerte ha hecho que la falta de densidad haya sido inminente.

Aun así la densidad de las calles es aceptable siendo muy beneficiosas las bajadas de temperatura experimentadas en días anteriores.



Cabe destacar que la última aportación de nutrientes al campo fue el **11 de Julio** con abono 15-5-20 a dosis de 10 gr/m2.

Esta falta de densidad ha sido aprovechada por la grama autóctona extendiéndose por zonas del campo hasta un 80% como puede ser la calle 5.

Al igual que en zonas anteriores no se realizaran las siguientes labores:

1. escarificado agresivo mediante tractor y sisis veemo.
2. Rajado del campo.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



3. Aporte de enmienda cálcica Cao a dosis de 25 gr/m²
4. Resiembra de ray grass a dosis de 35 gr/m²
5. Abonado 8-24-8 a dosis de 25 gr/m²

La **NO** realización de las labores anteriormente expuestas traerá consecuencias tales como falta de densidad en calles y un aspecto visual amarillento una vez entre la grama autóctona en latencia.

Los trabajos a realizar en sustitución a lo recomendado en planning serán la realización de recebos de arena de pinar proporcionado por el ayuntamiento, con la intención de fomentar la aparición de poa anua y cubrir las zonas de ausencia de hierba con poa anua, hierba autóctona “cool Season “ muy usual en invierno en Talayuela golf.

Esta labor la realizaremos con la mayor asiduidad posible, por lo que será de vital importancia la **colaboración** de ayuntamiento de Talayuela, garantizando en todo momento el suministro de arena.

Se recomienda en la medida de lo posible realizar una aportación de abono una vez se recebe el campo y la poa anua haga su aparición con la intención de homogenizar el campo con la mayor rapidez posible.

Una vez terminen los trabajos de resiembra en el Centro de la Real Federación Española de Golf se pedirá la cesión de la recebadora arrastrada Dakota para la realización de los dichos recebos.

6. Bunker

Los bunker se encuentran libres de hierbas siendo perfilados en el ultimo mes y habiendo realizados aplicaciones de herbicida en el contorno.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Llegan unos meses complicados para esta zona ya que la inmensa mayoría no drenan. En la medida de lo posible se mantendrán vacío, sobre todo de cara al fin de semana. Seguiremos con la realización de los mismos, Martes y Viernes.

Compromisos del Ayuntamiento

- **Puente del 8 y 6.** El ayuntamiento se comprometió en la terminación de los puentes para el mes de Septiembre a fecha de este informe no han comenzado las obras.
- **Cable del pozo 6.** Las obras empezaron durante el mes de agosto dejándolas finalmente inacabadas siguiendo enganchado al generador con los importantes costes que ello conlleva. Finalmente tras las lluvias de los últimos días Talayuela golf ya no necesita el servicio de este generador desde el día 24



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



de Septiembre siendo avisado al Sr. D. Marín para su retirada y a la empresa de alquiler Arvi propietaria del generador.

- **Arena de recebo.** Se ha llevado varios camiones de arena aunque persiste la necesidad de traer más cantidad ya que aun es insuficiente para el recebo. **En los próximos días comenzaran las labores de recebo por lo que será de vital importancia la colaboración del ayuntamiento en este aspecto.**
- **Personal de apoyo.** No se encuentra ningún operario cedido por el ayuntamiento, Habiendo finalizado el último operario el 11 de septiembre.
- **Lago de la 18.** Ya se encuentra acabado el lago. Desde el departamento de la Green Section no consideramos acertada ni la ubicación ni el método de construcción de este lago ya que presenta serias deficiencias en la construcción. En los próximos días se presentará un informe independiente desde la **Federacion Española de Golf** sobre este tema.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TABLA RESUMEN POR ZONAS DE LOS TRATAMIENTOS A REALIZAR

SEMANA	GREENES	ANTEGREENES	TEE	CALLES
1 al 7				
8 al 14				
15 al 21	Tratamiento azoxistrobin 1,5 ltr/ha	Tratamiento azoxistrobin 1,5 ltr/ha		Recebo de arena
22AL 28	prueba quinoclamina 75 gr/10 ltrs (musgo)			Recebo de arena
29 al 5	Abonado 18-6-18 a dosis de 15 gr/m2	Abonado 18-6-18 a dosis de 15 gr/m2		Recebo de arena

Comité de la Green Section

Federación Española de golf



¿Te gusta conducir?





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



AVIS

