



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG INFORME MENSUAL

Asunto


ZONAS AJARDINADAS CNG

Mayo, 2015

Presentes: Dña. Elena Cadenas, Becaria Green Section
D. Eloy Barranco, Técnico en Prácticas RFEG

INFORME MAYO ZONAS AJARDINADAS CENTRO NACIONAL DE GOLF

El mes de Mayo se ha caracterizado por un incremento continuo de los valores climatológicos en cuanto a las temperaturas, destacando valores por encima de los 30 °C de máximas diarias durante las últimas dos semanas del mes.

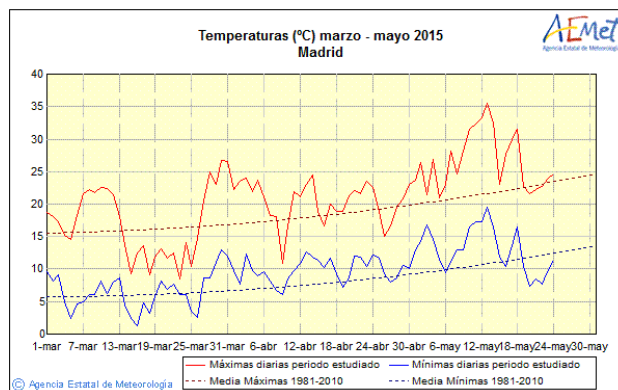

Cuadro de temperatura media durante el mes de Mayo.

Todas las labores de mantenimiento durante este mes se han centrado en finalizar la obra de riego de la pradera (que se explicará en el anexo de instalación de riego) y en los trabajos de conservación de las zonas del parking y entrada al CNG.

A continuación se detallará el estado de cada una de las zonas y las tareas a realizar.

Pradera

Durante este mes, el aspecto estético de la pradera ha mejorado bastante con respecto los meses anteriores. Finalizada la instalación completa de riego, las labores de mantenimiento se centraron principalmente al incremento de las siegas.

¿Por qué es importante segar? La siega es la práctica cultural fundamental del mantenimiento de las especies cespitosas y se basa en la eliminación periódica de parte del crecimiento acumulado por las plantas. A la vez que mejoramos la estética visual, ayudamos fisiológicamente el estado vegetativo de la planta, generando diversos efectos positivos como son:

- Planta más saludable.
- Reducción del crecimiento radicular, lo que provoca que se reactive el crecimiento foliar para la producción de más superficie fotosintética.
- Reducción de la competencia de las malas hierbas.

Como se puede apreciar a continuación (Foto 1 y 2), el incremento durante este mes con la frecuencia de 2-3 siegas por semana, ha hecho mejorar el estado general de la pradera. "Continuar en esta línea de trabajo".



Foto 1 y 2: Pradera sin segar y pradera actual segada.

Para ayudar a mejorar la homogeneidad y densidad de la especie cespitosa, se ha realizado a final de mes, un tratamiento de herbicida post-emergente contra manchas localizadas de especies adventicias de hoja ancha, entre la que destacamos las pertenecientes al género *Trifolium* (tréboles). Se utilizó herbicida Herbicruz con dosis de 90 ml por mochila de 15 L de agua.

Tareas pendientes de realizar:

Jueves 28 Mayo: Pinchado hueco + semillado + recebo.

Las labores culturales de aireación favorecerá la oxigenación y renovación del perfil radicular, evitando la rápida compactación y la formación del thatch. Mejoraremos también su drenaje superficial.

Otras labores de mantenimiento: Tanto la hiedra como los parterres se encuentran podados y exentos de malas hierbas (Foto 3).



Foto 3: Recortes de hiedra.

Zona de entrada al CNG y a la Federación

Los setos de las diferentes zonas y arriates presentan muy buenas condiciones y se encuentran libres de malas hierbas.



Foto 4: Estado general de la entrada al CNG.

Zona del parking

Se han realizado los desbroces de las malas hierbas en los parterres principales del parking.

El arbolado antiguo y en mal estado de la zona posterior del parking, se ha extraído y se ha limpiado.



Foto 5 y 6: Parterres limpios y arbolado retirado.

Zona de subida al putting green

Tanto la zona de subida como de bajada empiezan a descontrolarse y es necesario empezar con las labores de desbroce y limpieza.



Foto 7: Parterres con malas hierbas en la zona de subida al putting.

Zona de putting green

Al igual que ocurre con la zona de subida al putting, las malas hierbas están invadiendo los parterres. Desbrozar y limpiar la zona.

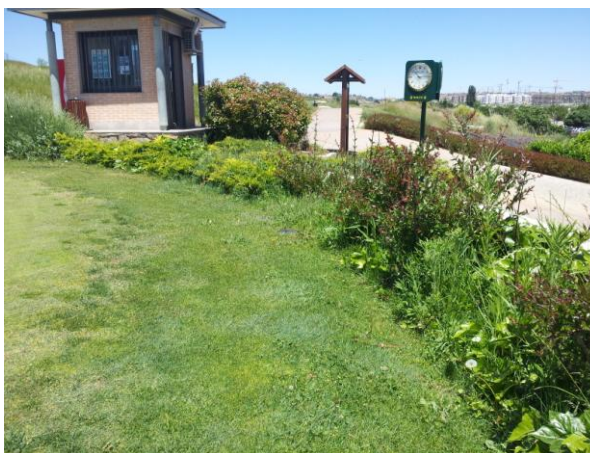


Foto 8: Estado general del putting.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Arbolado de los Tees

Como se comentó en el informe anterior, es conveniente realizar el trasplante de los árboles de los tees del hoyo 5 y 9, ya que se encuentran plantados encima de tuberías secundarias de riego de las plataformas de tees.

Se revisaron ambas plataformas con el encargado de riego y se decidió que lo mejor sería desplazar los árboles tres metros hacia atrás, para facilitar las maniobras de mantenimiento en las tuberías en caso de avería.

Anexo de Instalación de riego

A modo resumen, la obra de instalación de riego quedó organizada en dos pares de praderas con el siguiente contenido:

- **Arqueta principal:**

- Conexión con la tubería principal de 32 mm.
- 1 Programador de riego con cableado.

- **Arqueta de riego:**

- 4 fases de riego, cada fase continúa con tubería de 32 mm.
- 4 electroválvulas de 1".

- **Tuberías secundarias y aspersores:**

- Tuberías de 16 mm conectadas mediante collarines a la red general de riego.
- Aspersores de turbina 3/4".

Durante el mes de Mayo, quedaron pendientes de realizar las siguientes tareas:

- * Instalación del cableado.
- * Instalación de los programadores.
- * Repaso de la nivelación de todos los aspersores de riego. Comprobación cobertura de riego y ajuste de boquillas.
- * Preparación de los planos nuevos una vez finalizada la obra.

Se han finalizado todas las tareas pendientes, excepto la preparación del plano final, que se está desarrollando.

- Los programadores quedaron instalados (Foto 1) en sus correspondientes arquetas y la programación de riego se está desarrollando sin ningún problema.
- Los tepes de las zanjas se recebaron y nivelaron de nuevo. (Foto 2).
- Los aspersores solapan correctamente. (Foto 3).



Foto 1, 2 y 3: Programador de riego, solapes de aspersores y nivelación de zanjas.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Recibir un cordial saludo.

**Departamento Green Section
Real federación Española de Golf**

