



Real Federación Española de Golf
C/ Arroyo del Monte, 5
28035 Madrid
T +34 91 376 91 30 F +34 91 556 32 90

GREEN SECTION RFEG

Asunto

OPEN DE ESPAÑA 2015 EL PRAT

Mayo, 2015

Presentes:

D. José Gómez, Head Greenkeeper RCG El Prat
D. Santi Agustí, Asistente RCG El Prat
D. Francisco Carvajal, Vicepresidente AEdG
D. David Gómez, Director Green Section RFEG
D. Miguel Guerra, Técnico Green Section

RESUMEN FINAL OPEN DE ESPAÑA

Tras la fase de preparación y a lo largo del transcurso del evento se ha llegado a las siguientes conclusiones:

1º. ASPECTOS POSITIVOS:

- a. Se ha demostrado la buena relación y la compenetración entre la RFEG (Green Section) y RCGP (equipo de mantenimiento). La comunicación ha sido fluida y las decisiones ha sido tomadas de una forma consensuada. Relación que se reflejó también entre operarios y voluntarios.
- b. Pese a la presión añadida a que se vio sometido todo el equipo de mantenimiento del RCGP tras la caída de un gran número de árboles de la Propiedad, el equipo ha estado perfectamente organizado y dirigido para conseguir una presentación del campo a la altura de las circunstancias.
- c. La formación de los mecánicos y la metodología adquirida repercutirá de una manera muy positiva en el futuro.
- d. Destacar el nivel de firmeza alcanzado en todo el campo.

2º. ASPECTOS NEGATIVOS:

- a. Bunkers: Pese a las recomendaciones externas, el desarrollo del Torneo ha demostrado que no se debió eliminar arena de las “faces” de los bunkers. Opción que trajo como resultado una mayor y más ardua labor de mantenimiento y que derivó en la aparición de clavos y tela asfáltica en algunos de los bunker del recorrido. Además el problema que trataba de solucionar esta opción (aparición del “huevo frito” se trasladó a la zona de unión entre la “face” y la base del bunker.
- b. Greenes. Se podría haber mejorado los valores de rodadura de bola mediante el aumento de la frecuencia de pase de rulo a 2 veces al día (uno por la mañana y otro por la tarde).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



- c. Se hizo evidente la necesidad de una mayor presencia de la figura del Jefe de Mecánicos en la fase de programación del evento. Para futuras ediciones, Miguel Guerra debería estar presente desde la programación con el fin de fijar un protocolo de actuación durante el Torneo, y revisarlo para su correcto funcionamiento en campo.
- d. Se considera que la realización de eventos externos al Campeonato, como puede ser el seminario para los greenkeepers, es incompatible con las labores propias de mantenimiento.
- e. En próximos eventos, se considera imprescindible remitir los programas de mantenimiento que se van a seguir durante el Campeonato, con al menos un mes de antelación, para que puedan ser corregidos/ampliados y sobre todo consensuados; e implementados por el equipo de mantenimiento de cara a la competición.
- f. Desde este Departamento entendemos que la naturaleza de la relación entre el departamento agronómico del ET y la RFEG ha de ser colaborativa y no impositiva.


INFORME FINAL DE CAMPEONATO. OPEN DE ESPAÑA 2015

Durante los días del 14 al 17 de Mayo se celebró el Open de España de 2015 en el Real Club de Golf El Prat. A continuación, analizaremos el programa general de mantenimiento desarrollado a lo largo de la semana y la presentación final del campo.

En primer lugar felicitar al equipo de mantenimiento, liderados por su greenkeeper y asistente, por el esfuerzo, dedicación y el trabajo tan encomiable realizado durante la semana y los meses antes del torneo, pues no hay que olvidar el estado en que quedó el campo debido a los destrozos y daños causados por el paso del huracán.

En segundo lugar, felicitar al equipo de voluntariados por su disposición y colaboración con el equipo de mantenimiento. Demostrando su entusiasmo y profesionalidad en todas las labores encomendadas.

El resultado final ha sido conseguir que la presentación del campo reciba todos los elogios por unanimidad de los medios de comunicación deportivos y de los profesionales participantes. La definición en todas las zonas de juego fueron incrementándose positivamente a lo largo de la semana gracias a los planning de trabajo y la climatología favorable que acompañó durante todo el torneo.

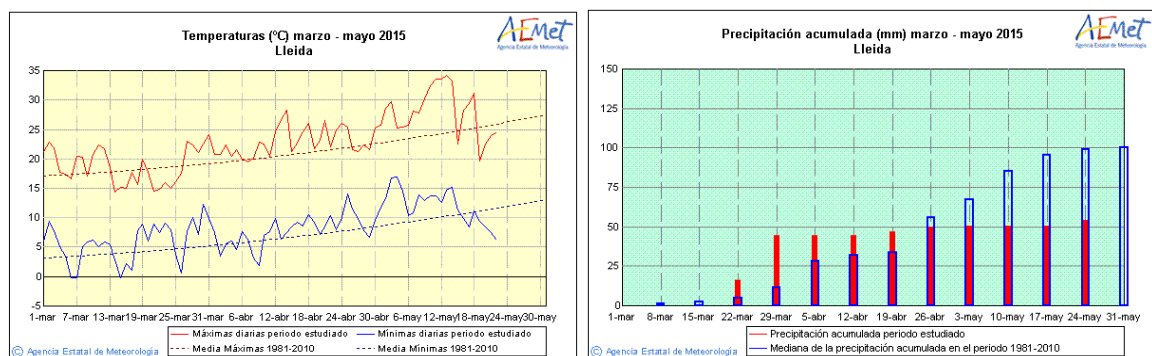

Gráficos de temperatura media y precipitaciones del mes de Mayo.

Cada miembro del equipo de mantenimiento conocía muy bien su labor asignada, planificándose diariamente las labores realizadas en dos turnos de trabajo: Turno de mañana (de 05:00 - 9:00 horas) y turno de tarde (de 17:30 - 21:30 horas).

A continuación se analizarán las labores realizadas en cada una de las zonas de juego y el planning diario del trabajo que se ha desarrollado durante la semana, con el fin de aprender de ellas y tenerlas en cuenta en un futuro campeonato de esta gran envergadura.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



PLANNING DIARIO DE TRABAJO DURANTE LA SEMANA DEL OPEN

<i>TURNO DE MAÑANA</i>	<i>TURNO DE TARDE</i>
*GREENES: Siega con doble corte, excepto los greens (10, 11, 12 y 17) con siega simple. Maquinaria manual y altura a 3 mm. Pase de rulo. *ANTEGREENES: Siega con tripleta. Altura 6,5 mm. *TEES: Siega con manual y cruzado. Altura 6,5 mm. *CALLES: Siega con tripleta y vuelta de limpieza en dirección del juego. Altura a 9,5 mm. *SEMI-ROUGH: Siega en dirección del juego. Altura 32 mm. Siega de pasarelas entre tees. *ROUGH-INTERMEDIO: Siega en dirección del juego. Altura 64 mm. *ROUGH: Primera siega en dirección contraria al Rough-Intermedio y después alternando con altura de 64 mm. *CAMBIO de BANDERAS: Detrás de la siega de los greens. *BUNKERS: Rastrillado manual en sentido del green (bunkers de calle) y en sentido a la posición de bandera (bunkers de green). Colocación de rastrillos. * TALLER: Preparar maquinaria para la tarde.	*GREENES: Soplar y reparar piques. Pase de rulo hasta 2 metros fuera del green. Medición de humedad y riego en las zonas necesarias. *ANTEGREENES: Siega con tripleta. Riego en zonas necesarias. *TEES: Siega con manual en cruzado. Soplar, no reparar chuletas y pase de rulo en los PRO. *CALLES: Siega con tripleta y vuelta de limpieza en dirección del juego. Riego en zonas necesarias. Reparar chuletas. *SEMI-ROUGH: Siega en dirección del juego. Siega de pasarelas entre tees. *ROUGH-INTERMEDIO: Siega en dirección del juego. *ROUGH: Primera siega en dirección contraria al Rough-Intermedio y después alternando. *BUNKERS: Chequear todos los bunkers, reparar las telas y rellenar con arena en algunas zonas necesaria. * TALLER: Preparar maquinaria para la mañana.

GREENES Y ANTEGREENES

Los programas preparativos que se realizaron meses antes al torneo (Micropinchados, Verticados, Recebos + Programas de tratamientos con reguladores de crecimiento y control de *Poa*) favorecieron a generar un mayor grado de uniformidad y homogeneidad en los greens, fortaleciendo a la planta de cara al estrés que recibirá durante el torneo.

Con la frecuencia diaria de siega y los pases del rulo en los dos turnos, los greens han mostrado muy buenas condiciones de firmeza (Foto 1 y 2) y a lo largo de la semana la velocidad de rodadura de la bola se mantuvo homogénea con valores comprendidos entre 11 - 12 pies).



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 1 y 2: Presentación general de greens y antegreens.

Muchos de los greens mostraron a lo largo de la semana secas por el estrés sufrido con las siegas, pases del rulo y el tránsito del juego diario. Se estableció un programa de control de la humedad, de riego con apoyo de mangueras y se elaboró un plan de tratamientos a base de humectante.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



TEES Y CALLES

Tanto las plataformas de los tees como las calles han presentado un aspecto estético limpio, con gran firmeza, muy bien definidas y con una gran densidad de cobertura vegetal generalizada (Foto 3).

Ambas tuvieron una frecuencia de siega diaria durante los dos turnos de trabajo. Las plataformas de los tees de profesionales fueron sopladas y ruladas. En las calles se limpiaron las chuletas y se recebaron con arena de color verde para mimetizar su colorido.



Foto 3: Estado general de tees.

Gracias a la frecuencia diaria de la siega y al correcto estado de la maquinaria se ha permitido obtener esta calidad y definición deseada en cada una de las zonas de juego (Foto 4 y 5).

De ahí la importancia de la figura del mecánico y del asesoramiento recibido los meses previos al campeonato, para poner a punto toda la maquinaria disponible. Como sabemos, la salud y el crecimiento de la planta dependen en gran medida de la calidad de la siega.



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Foto 4 y 5: Calidad y definición de siega en calles.

ROUGH

El rough mostraba un aspecto uniforme y muy buena densidad en todas las zonas del campo. Se realizaron tres tipos de alturas de siega en el rough (Foto 6):

- * Semi-Rough: Con altura de corte a 32 mm y siega en dirección del juego.
- * Rough-Intermedio: Con altura de corte a 64 mm y siega en dirección del juego.
- * Rough: Se cortó una única vez a 64 mm y posteriormente se le permitió a la planta crecer.

BUNKERS

La presentación final de los bunkers fue la deseada. Todos los bunkers se encontraron perfilados y con los bordes desbrozados (Foto 7 y 8).

Durante el turno de mañana se rastrillaron manualmente en dirección del green (bunkers de calles) y en dirección a la bandera (bunkers de greenes). Por la tarde, se realizaron reparaciones de algunas telas en las zonas con pendientes y se añadieron aportaciones de arena en aquellas zonas necesarias, revisando diariamente la profundidad de la misma, con el fin de evitar el hundimiento de la bola en la arena.



Foto 7 y 8: Aspecto general de perfilado y rastrillado de bunkers.

OTRAS LABORES DE MANTENIMIENTO

Las labores de limpieza general, como desbroces y limpieza de caminos, podas de arbolado, mantenimiento de las zonas de juego del putting and chipping green y cancha de prácticas, han resultado ser de gran importancia de cara a la presentación final del campeonato.

Durante los dos turnos de trabajo se ha llevado a cabo la preparación de estas zonas, para que estuviesen en perfectas condiciones de uso a los jugadores y a los aficionados que acompañasen el Open a lo largo de la semana.





REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE GOLF



Finalmente, agradecer de nuevo al equipo de mantenimiento y voluntariados por la dedicación y preparación empleada antes y durante la semana del Open.

Departamento Green Section
Real federación Española de Golf
